مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الأداره العامه للتنفيذ و الأشراف	شركة طرق الرياض للمقاولات
	اداره تفيذ الطرق	
	مشروع تلال الغروب	☑ تقديم جديد
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	☐ اعادة تقديم

اسم الحي :الامير فواز   رقم المخطط: BLOCK03   رقم الشارع : PED-AREA02   عرض الشارع: 9.8

استلام الطبقة : TOP SUBBASE   000+0   الى محطة رقم :263.95+0

اعمال اخرى :

توقيع مهندس الموقع :   التاريخ : 7/12/2024

☐ المراقب   ☐ المساح   ☐ المختبر   توقيع المهندس المشرف ....

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : 000+00.........   الي المحطه : 263.95+0........

من المحطه : ....   الي المحطه : ....

مرفقات :   ☐ القطاع الطولي   ☐ القطاع العرضي   ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : ....   التوقيع: التاريخ : / /

من محطة :   الى محطة :

....   توقيع المساح :   التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد   ☐ مرفق   قيمه البركتور :   الرطوبه المثلي :

☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه :   ☐ ناجح   ☐ راسب   التوقيع : ....   التاريخ : / /

ملاحظات   ضروره لورنمات نتائج الأختبارات

تعليمات المهندس الاستشاري :

☐ موافق   ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....   مندوب المقاول : ....   التوقيع : ....   التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقرير إستلام طبقة ردم

		تلال الغروب	إسم المشروع :-
PED-B03-02	رقم الشارع :-	BLOCK03	رقم المخطط :-
263.97M	طول الشارع :-	TOP SUBBASE	رقم الطبقة :-
9.8	عرض الشارع :-	LAYAER THICKNESS	
	WIDHT-R 4.900	DEOTH FROM TOP SUB.G	
	WIDHT-L 4.900		

PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L	R			CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	-2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.00%	2.00%		
				1.00	1.500	2.400	0.000	2.400	1.500	1.00		
1	0	530091.286	2369369.785	58.190	58.170	58.200	58.200	58.200	58.170	58.190	4.900	4.900
2	12.5	530102.829	2369364.989	58.251	58.231	58.261	58.261	58.261	58.231	58.251	4.900	4.900
3	25	530114.372	2369360.193	58.313	58.293	58.323	58.323	58.323	58.293	58.313	4.900	4.900
4	37.5	530125.916	2369355.397	58.374	58.354	58.384	58.384	58.384	58.354	58.374	4.900	4.900
5	50	530137.459	2369350.600	58.435	58.415	58.445	58.445	58.445	58.415	58.435	4.900	4.900
6	62.5	530149.002	2369345.804	58.496	58.476	58.506	58.506	58.506	58.476	58.496	4.900	4.900
7	75	530160.545	2369341.008	58.558	58.538	58.568	58.568	58.568	58.538	58.558	4.900	4.900
8	87.5	530172.089	2369336.212	58.619	58.599	58.629	58.629	58.629	58.599	58.619	4.900	4.900
9	100	530183.632	2369331.416	58.699	58.679	58.709	58.709	58.709	58.679	58.699	4.900	4.900
10	112.5	530195.175	2369326.620	58.804	58.784	58.814	58.814	58.814	58.784	58.804	4.900	4.900
11	125	530206.719	2369321.824	58.926	58.906	58.936	58.936	58.936	58.906	58.926	4.900	4.900
12	137.5	530218.262	2369317.028	59.049	59.029	59.059	59.059	59.059	59.029	59.049	4.900	4.900
13	150	530229.805	2369312.231	59.173	59.153	59.183	59.183	59.183	59.153	59.173	4.900	4.900
14	162.5	530241.348	2369307.435	59.296	59.276	59.306	59.306	59.306	59.276	59.296	4.900	4.900
15	175	530252.892	2369302.639	59.419	59.399	59.429	59.429	59.429	59.399	59.419	4.900	4.900
16	187.5	530264.435	2369297.843	59.542	59.522	59.552	59.552	59.552	59.522	59.542	4.900	4.900
17	200	530275.978	2369293.047	59.665	59.645	59.675	59.675	59.675	59.645	59.665	4.900	4.900
18	212.5	530287.521	2369288.251	59.788	59.768	59.798	59.798	59.798	59.768	59.788	4.900	4.900
19	225	530299.065	2369283.455	59.922	59.902	59.932	59.932	59.932	59.902	59.922	4.900	4.900
20	237.5	530310.608	2369278.659	60.161	60.141	60.171	60.171	60.171	60.141	60.161	4.900	4.900
21	250	530322.151	2369273.862	60.528	60.508	60.538	60.538	60.538	60.508	60.528	4.900	4.900
22	262.5	530333.695	2369269.066	60.959	60.939	60.969	60.969	60.969	60.939	60.959	4.900	4.900
23	263.95	530335.054	2369268.502	61.010	60.990	61.020	61.020	61.020	60.990	61.010	4.900	4.900

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م/ فاضل محمد		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-

مكتب رمك للاستشارات الهندسية - مشاريع البنية التحتية

شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة
س.ت (1010291003)
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.90
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	07-12-24
Location	جدة - حى الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Tested By	Abdullah
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Location	Gardens Area No 03 Block 03

FIELD TEST RESULTS

TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	Gardens Area 03	2.277	2.110	7.9	97.5	
2	Gardens Area 03	2.352	2.190	7.4	101.2	
3	Gardens Area 03	2.346	2.183	7.5	100.9	
4	Gardens Area 03	2.330	2.160	7.9	99.8	
5	Gardens Area 03	2.319	2.149	7.9	99.3	

M.D.D = 2.164 kg/m3
O.M.C = 7.46 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management. Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.



Cheked by 

Approved by

BLOCK 3

BLOCK 3

St. B03-1

RO-B03-1

START 0+217.50
ELE:59.952

59	58	57	56
F.F.L=59.53	F.F.L=59.93	F.F.L=60.44	F.F.L=61.04

PED-B03-A

PED-B03-B

PED-B03-1A

PED-B03-1B

60	61	62	63
F.F.L=59.60	F.F.L=60.09	F.F.L=60.98	F.F.L=61.47

RO-B03-2

67	66	65	64
F.F.L=59.60	F.F.L=60.09	F.F.L=60.08	F.F.L=61.47

PED-B03-2

68	69	70	71	72
F.F.L=59.82	F.F.L=60.44	F.F.L=61.01	F.F.L=61.62	F.F.L=62.27

St. B03-3

RO-B03-3

77	76	75	74	73
F.F.L=59.82	F.F.L=60.44	F.F.L=61.03	F.F.L=61.62	F.F.L=62.17

PED-B03-3

78	79	80	81
F.F.L=59.73	F.F.L=60.47	F.F.L=61.21	F.F.L=61.95


St. B03-4

RO-B03-4

BLOCK 3

PLOT AREA = 62,293 m2
TOTAL BUILTUP AREA = 162,822 m2

FAR = 2.61
557 PARKING SPACES
528 UNITS

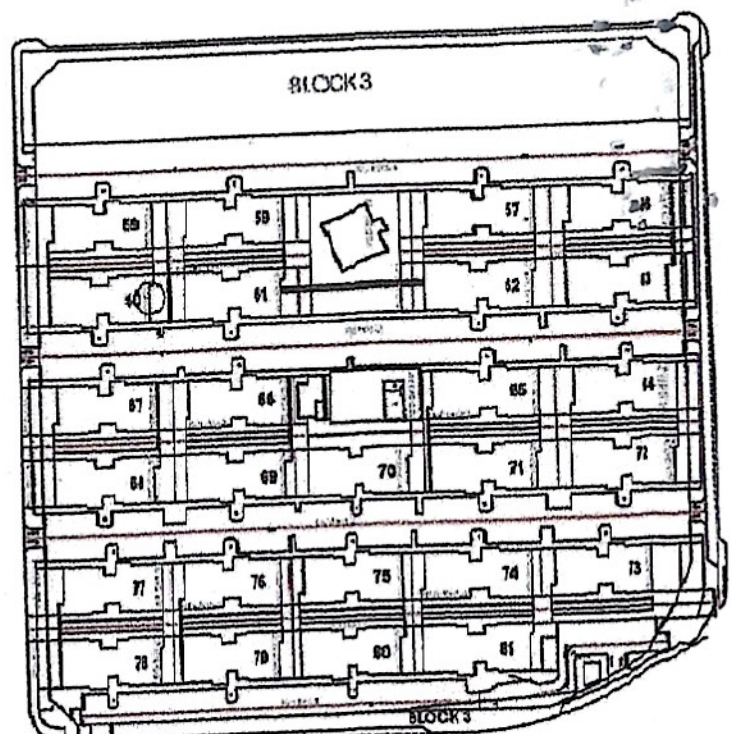

اتجاة تصريف المياة

الأرض الطبيعية

الخط التصميمى

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
امانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام/ الابنية للاستشارات الهندسية

Abnia Consulting Engineers
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع ظلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350

مديرعام الدراسات والتصاميم

مدير ادارة تصميم الطرق
